

Zurück an:

Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG  
Anschlusswesen  
Reichsstraße 9  
72250 Freudenstadt

Planung & Bau

Ansprechpartner/in: Anschlusswesen  
Gebäude: Kleinrheinstraße 4  
E-Mail: anschlusswesen@sw-freudenstadt.de  
Telefon: 07441 921-210  
Telefax: 07441 921-498

## Bestellformular Einspeisemanagement

### Standort der Erzeugungsanlage

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Besteller

Vor- Nachname: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Rechnungsempfänger

Vor- Nachname: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Lieferadresse

Vor- Nachname: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Stückzahl	Fernwirktechnik	Preis
1	Bestellung einer vorkonfigurierten Fernwirktechnik (Acos 730). Hardwarekosten, Lizenzkosten, Programmierungskosten sowie die Montage und Inbetriebnahmekosten sind enthalten. Die Abschaltanlage beinhaltet 8x Digitale Eingänge 24VDC, 4x Digitale Ausgänge 24VDC und 2x Analoge Eingänge / +/- 25mA. Die primäre Stromversorgung wird über 230 VAC, mit einer Absicherung v. 6A realisiert, diese muss v. Anlageneigentümer bereitgestellt werden. Jede weitere Anfahrt, die durch fehlende Daten oder fehlende Anschlüsse verursacht wird, wird dem Rechnungsempfänger zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Lieferzeit kann bis zu 6 Wochen betragen!	2.200,00 € <sup>1</sup> 2.500,00 € <sup>2</sup>
	Preis Netto	2.200,00 € <sup>1</sup> 2.500,00 € <sup>2</sup>
	zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer von z.Zt.19%	418,00 € <sup>1</sup> 475,00 € <sup>2</sup>
	Gesamtbetrag	2.618,00 € <sup>1</sup> 2.975,00 € <sup>2</sup>

<sup>1</sup> bis 30.09.2023

<sup>2</sup> ab 01.10.2023

## Technische Anschlussbedingungen

*Diese Voraussetzungen müssen bei der Inbetriebnahme der Stromerzeugungsanlage erfüllt sein:*

Einbau der Fernwirktechnik (FWT) erfolgt über Hutschienebefestigung, vorzugsweise im Zählerplatz. Hierfür muss ein Reservefeld vorhanden sein. Die Verlegung der Steuerleitung zwischen FWT und dem Wechselrichter muss vom Anlagengerichter vorgenommen werden.

Die Leitungsverlegung muss frei von Funktionsbeeinträchtigungen und Störeinflüssen sein.

Weitere Montagevorschriften ergeben sich aus den Technischen Anschlussbedingungen VfEW

und den ergänzten Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG.

Diese können auf der Homepage der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG

unter: <https://www.stadtwerke-freudenstadt.de/energie-versorgung/strom#einspeiser-erzeuger> eingesehen werden.

Zur technischen Umsetzung müssen die Befehle und Rückmeldungen der EEG Anlage (EEG 2023 §9 Abs2 Nr1), wie im Klemmenplan (siehe unten) beschrieben, von 0%, 30%, 60% und 100% zur Verfügung stehen. Zudem ist ein Messwert der momentan erzeugten elektr. Leistung bereitzustellen.


Hiermit beauftrage ich/wir die Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG mit der vorgenannten Leistung. Wir akzeptieren die Bedingungen über die Bestellung und bereiten die Anlage gemäß den Angaben vor.

---

Ort / Datum

---

Unterschrift

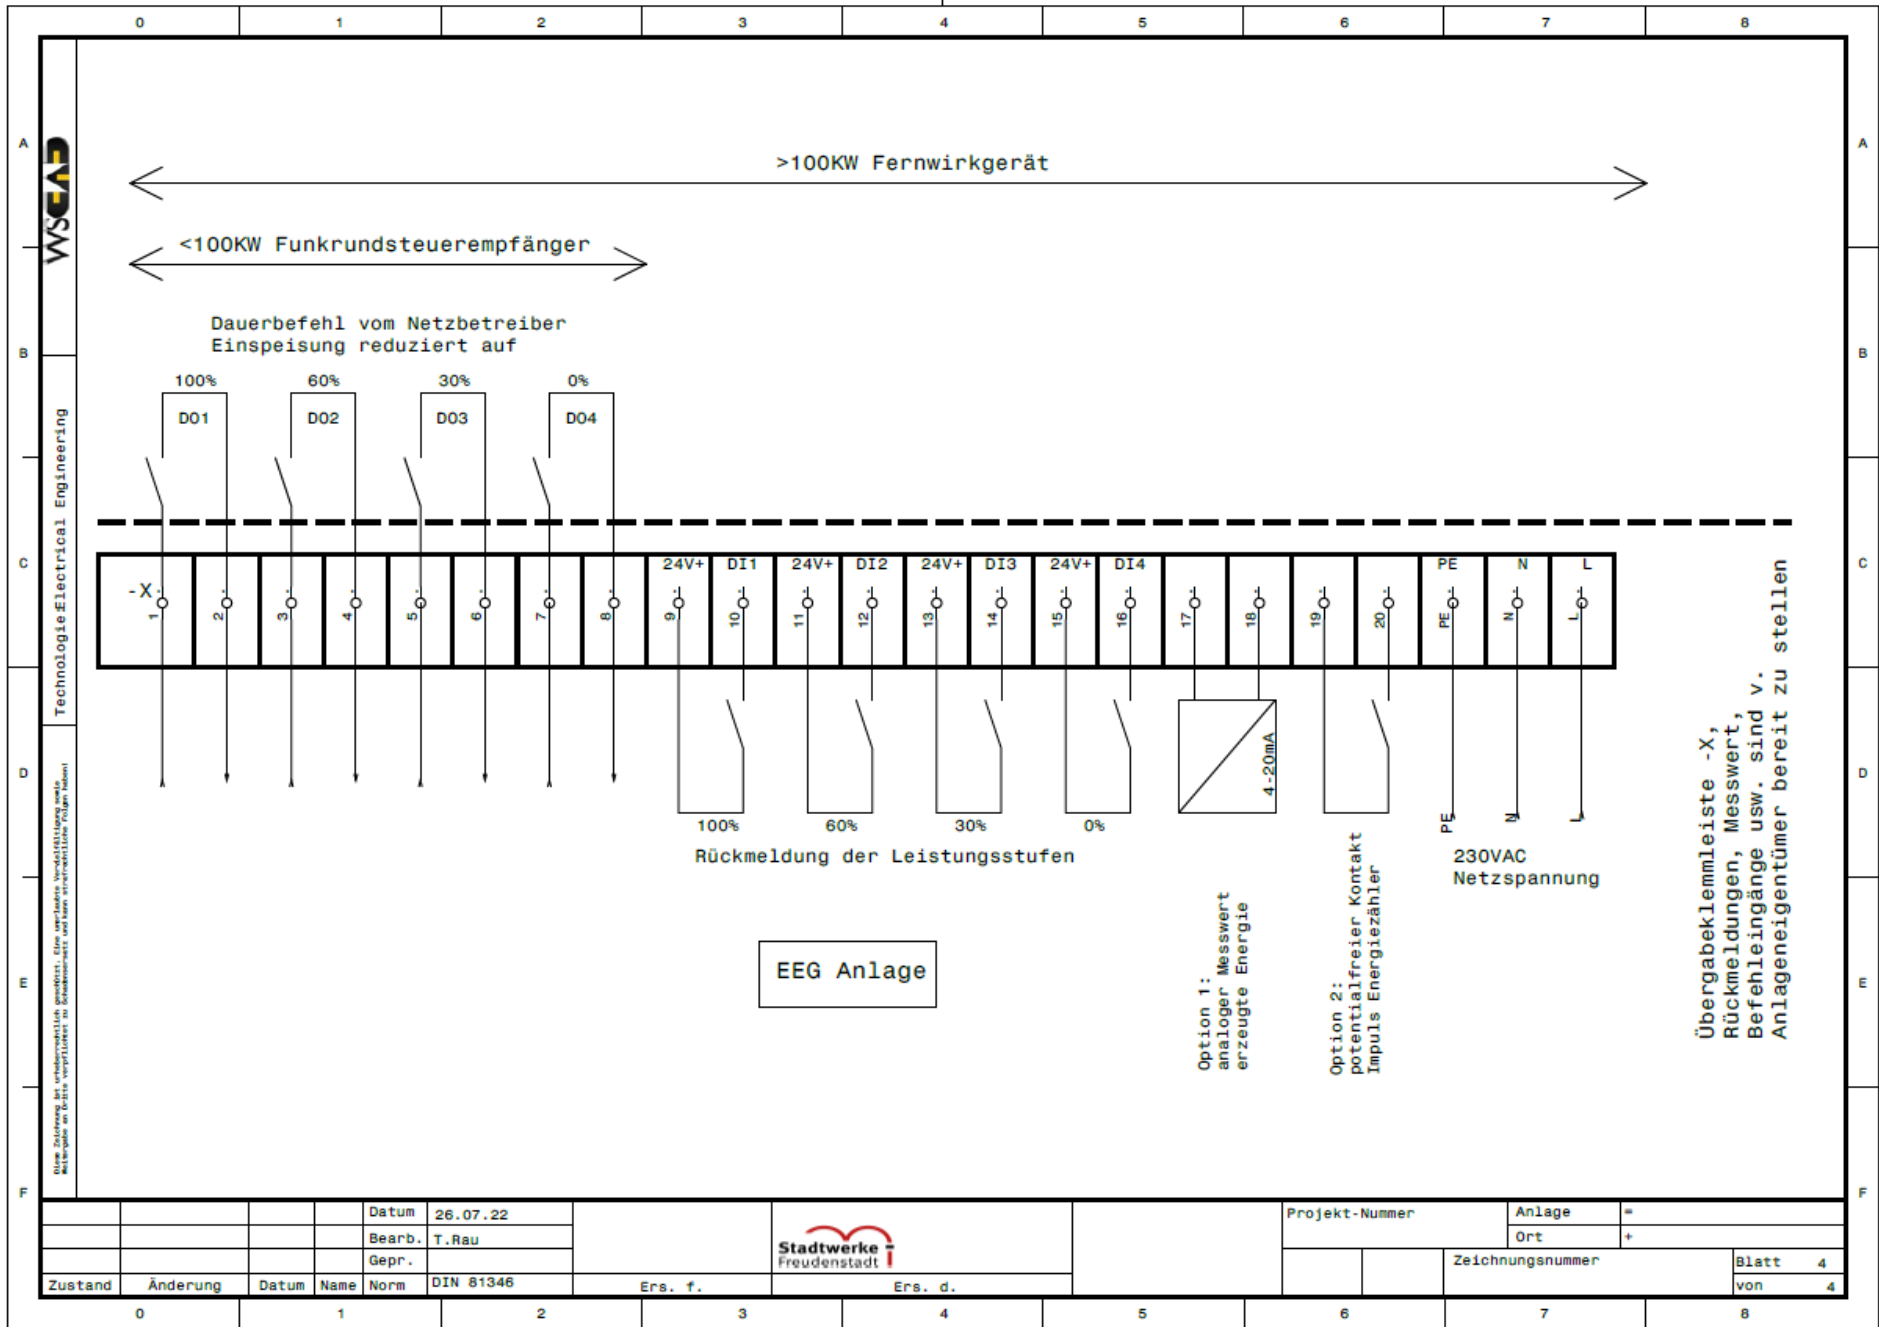

Datum		26.07.22				Projekt-Nummer		Anlage	=
Bearb.		T.Rau				Ort		+	
Gepr.						Zeichnungsnummer		Blatt 4	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346	Ers. f.	Ers. d.	Blatt 4 von 4	
